

NOSSE CT



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

RELATÓRIO DE **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Março/2020

VASCAÍNOS e VASCAÍNAS,

O mês de março chegou ao fim e estamos cada dia mais próximos de encerrarmos a primeira fase do projeto do NossoCT, com as obras já alcançando quase 50% do total.

Contudo, a partir de agora o ritmo deve ganhar intensidade, uma vez que a parte mais demorada – de aterramento – está concluída, o que permite que os técnicos trabalhem com força em outras frentes. Uma dessas frentes é o mastro, cuja inauguração estava prevista para o final do mês de março, mas por medida de segurança em virtude das restrições sanitárias impostas pelo COVID-19, o Clube a adiou indefinidamente. Outra frente é o gramado, na qual a GreenLeaf, empresa referência no mercado, foi contratada e já realiza os primeiros trabalhos relacionados à drenagem.

Por isso, sua doação é vital para atingirmos o valor necessário para conclusão da obra. Estamos atentos a todas as adversidades impostas pela pandemia do Coronavírus, mas o clube segue firme no seu objetivo de inaugurar o Nosso CT nos próximos meses. Assim, como forma de catapultar as doações o clube lançou como opção de recompensa exclusiva o Uniforme do CT, limitado a 2020 unidades que não serão comercializadas. Mais informações estão disponíveis em www.nossoct.com.br/uniforme. Outras recompensas seguem disponíveis para doações a partir de R\$15,00, e você pode ajudar neste importante projeto acessando www.vasco.com.br/ct.

Saudações Vascaínas!

SIGA EM FRENTE ACOMPANHANDO E CONTRBUINDO!!!

01

TOTAL
ARRECADADO
ATÉ 31/03

107% DA META

1° OBJETIVO / 2 MILHÕES	
DOAÇÃO DIRETA	50.000
DOAÇÃO KICKANTE¹	2.092.899
TOTAL	2.142.899

104% DA META

2° OBJETIVO / 1,5 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	1.218.806
DOAÇÃO ADICIONAL INGRESSOS²	27.970
DOAÇÃO SOBRE RENDA DO JOGO³	6.680
DOAÇÃO BMG⁴	300.000
TOTAL	1.553.456

66% DA META

3° OBJETIVO / 1,5 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	216.280
DOAÇÃO BMG⁵	700.000
LOJA DO GIGANTE⁶	8.931
FENG⁷	70.000
TOTAL	995.211

¹

Ajuste de R\$ 9.149,62 do total arrecadado no primeiro objetivo, passando de R\$ 2.102.049 para R\$ 2.092.899, em virtude de pagamentos estornados ou não processados.

²

Doação de R\$ 10,00 feita pelos torcedores ao adquirem ingressos para as partidas contra o Fortaleza, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro.

³

Doação de R\$ R\$ 5,00 de cada ingresso vendido no jogo VAS x FLA - Sub 20, feita pelo clube.

⁴

O BMG contribuiu com R\$ 300 mil para concluir o segundo objetivo da campanha.

⁵

O BMG contribuiu com mais R\$ 500 mil para dar o pontapé no terceiro objetivo, além de R\$ 200 mil por cada 10.000 contas abertas.


⁶

Doação de 10% sobre as vendas acima de R\$ 300,00 entre os dias 12/12/2019 e 19/12/2019, feita pelas lojas do Gigante.

⁷

Parceira do Vasco da Gama na administração do seu programa de Sócio-Torcedor, a FENG doou R\$ 70 mil pela conquista de 100 mil sócios.

TOTAL ARRECADADO ATÉ 31/03	
1° OBJETIVO	2.142.899
2° OBJETIVO	1.553.456
3° OBJETIVO	995.211
TOTAL	4.691.566



* Sobre os valores disponíveis na Kickante incidirá a comissão deste fornecedor, que será, oportunamente, calculada nos termos contratuais.

** Todos os valores entre parênteses são negativos.

03


ORÇADO X REALIZADO
ATÉ 31/03

%

GRUPO	2019 REALIZADO	JAN.20 REALIZADO	FEV.20 REALIZADO	MAR.20 REALIZADO	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL ORÇADO X REALIZADO
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	166.947,22	15.201,40	88.203,02	23.806,36	674.175,00	294.158,00	43,6%
SERVIÇOS PRELIMINARES	360.165,27	60.373,24	17.381,70	6.853,28	526.750,00	444.773,49	84,4%
DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA	39.998,28	12.590,88	44.949,03	31.019,07	647.580,06	128.557,26	19,9%
CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	55.138,55	1.258,78	2.285,00	2.000,00	88.250,00	60.682,33	68,8%
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	30.536,94	-	10.249,35	13.143,41	156.390,00	53.929,70	34,5%
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-		70.000,00	-	0,0%
OPERAÇÃO DE CANTEIRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-		10.000,00	-	0,0%
PREPARO DE TERRENO	167.683,30	120.066,18	133.624,51	278.031,49	986.437,50	699.405,48	70,9%
CAMPOS DE FUTEBOL	-	-	-	540.125,00	1.596.144,00	540.125,00	33,8%
EDIFICAÇÕES	-	-	-		1.200.000,00	-	0,0%
CERCAMENTOS MURO E ADORNO	260.495,17	41.255,60	213.730,08	61.922,56	1.328.650,00	577.403,41	43,5%
FUNDAÇÕES	-	-	-		145.738,35	-	0,0%
TOTAL	1.080.964,73	250.746,08	510.422,69	956.901,17	7.430.114,91	2.799.034,67	37,7%



PERCENTUAL
DE DOAÇÕES
POR REGIÃO



04

RELATÓRIO
TÉCNICO
DO PERÍODO

CRONOGRAMA DA OBRA

MESES		MARÇO				ABRIL					MAIO			
ATIVIDADES MACRO		1 a 8	09 a 15	16 a 22	23 a 31	1 a 5	06 a 12	13 a 19	20 a 26	27 a 30	1 a 10	11 a 17	18 a 24	25 a 31
1	DOCUMENTAÇÃO													
2	LICENÇAS													
3	PROJETOS													
4	ACOMPANHAMENTO DE TOPOGRAFIA													
5	SEGURANÇA PATRIMONIAL													
6	ATERRO e COMPACTAÇÃO													
7	TERRAPLANAGEM													
8	MURO DE DIVISA - FRENTE													
9	MURO DE DIVISA - LATERAL DIREITA													
10	MURO DE DIVISA - LATERAL ESQUERDA													
11	MURO DE DIVISA - FUNDOS													
12	ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÕES DE ENTRADA E PEDESTRES)													
13	MASTRO E BANDEIRA													
14	REDE DE INFRA ESTRUTURA HIDRASANITÁRIAS (DPA E DPE)													
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS													
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS													
17	INSTALAÇÕES GÁS INTERNAS													
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INTERNAS													
19	INSTALAÇÕES ESPECIAIS INTERNAS													
20	INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS INTERNAS													
21	RADIER - MÓDULO DOS ATLETAS													
22	GUARITA													
23	MÓDULOS DOS ATLETAS													
24	POÇO ARTESIANO E OSMOSE REVERSA													
25	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
26	CONSTRUÇÃO DO CAMPO 01													
27	CONSTRUÇÃO DO CAMPO 02													

PROXIMAS CONTRATAÇÕES

MESES		MARÇO				ABRIL					MAIO			
ATIVIDADES MACRO		1 a 8	09 a 15	16 a 22	23 a 31	1 a 5	06 a 12	13 a 19	20 a 26	27 a 30	1 a 10	11 a 17	18 a 24	25 a 31
1	MÓDULO DOS ATLETAS													
2	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO													
3	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA													
4	AR CONDICIONADO													



IMAGENS
DA OBRA



MURO FRONTAL



MURO LATERAL

MASTRO




MURO FRONTAL VISTO POR DENTRO



NIVELAMENTO DA DRENAGEM DO GRAMADO



PINTURA FINAL DO MASTRO

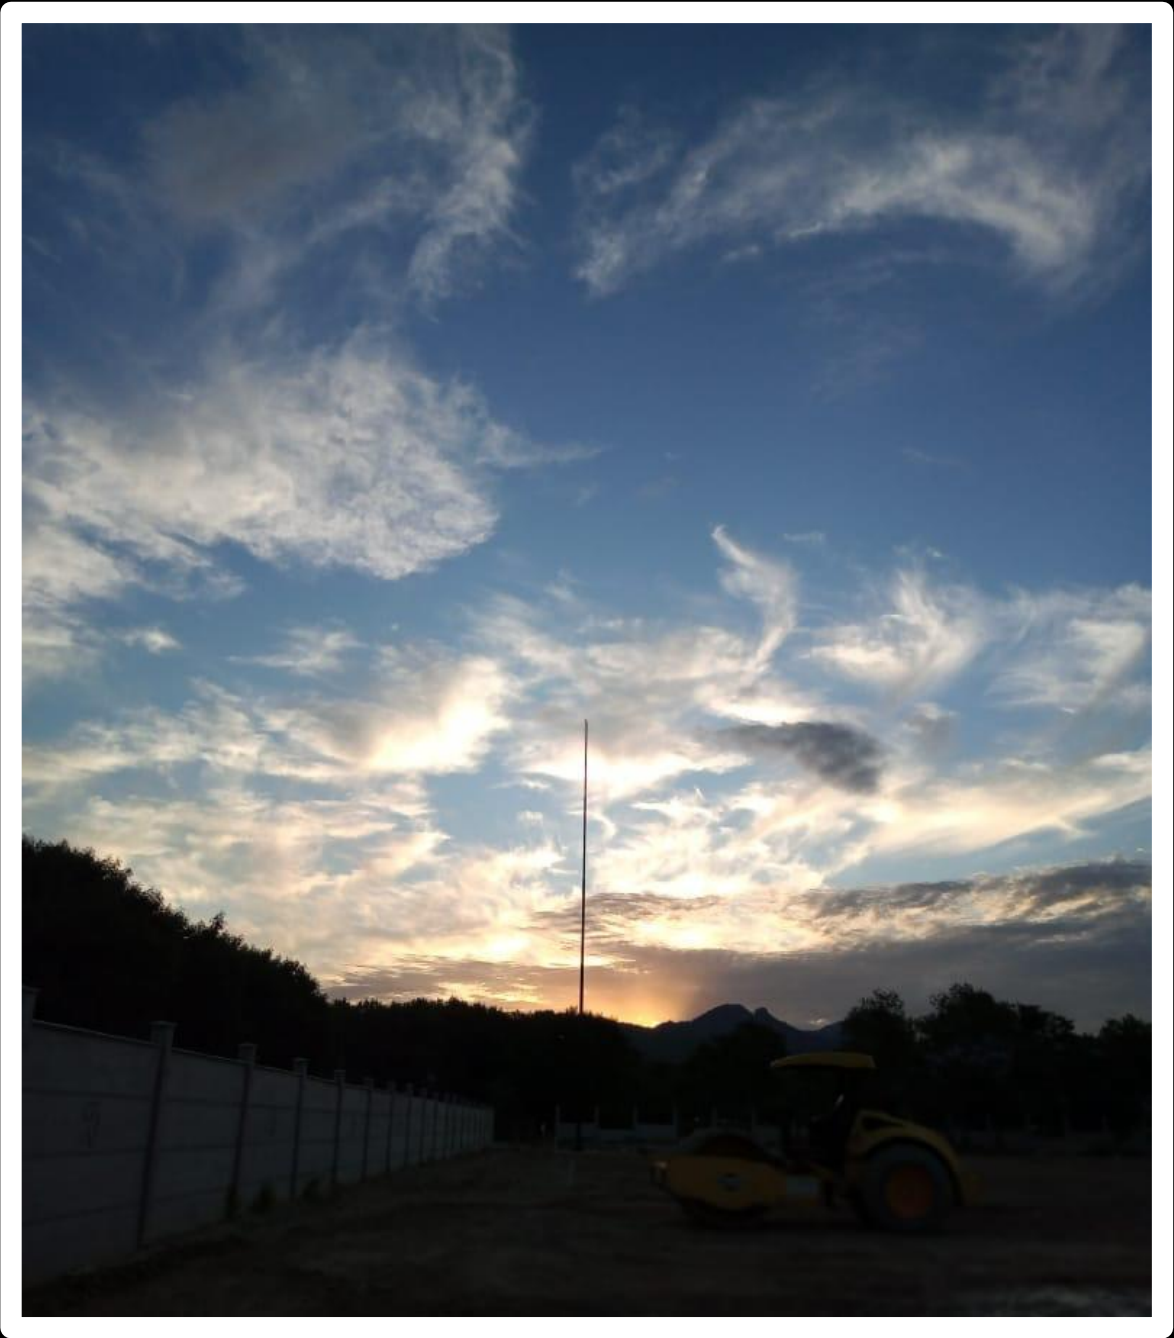

O PÔR DO SOL ILUMINANDO O NOSSO MASTRO



NOSSO ET
