



CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril/2020

VASCAÍNOS e VASCAÍNAS,

O mês de maio chegou e continuamos diante de uma crise sanitária sem precedentes o que vem exigindo de todos nós cada vez mais solidariedade, esforço e sacrifício para enfrentarmos as dificuldades e continuarmos seguindo em frente, evoluindo.

O Clube se mobilizou para arrecadar e destinar alimentos às comunidades vizinhas ao Nosso CT, tendo distribuído 380 cestas básicas, no mês de abril, para as famílias moradoras da Cidade de Deus, com bom impacto social na comunidade.

O lançamento oficial da camisa do Uniforme do CT, com a participação dos ídolos Leandro Castan, Fredy Guarin e Talles Magno, foi um grande sucesso. Nossa torcida aprovou com entusiasmo esta recompensa para as doações.

As obras do Nosso CT avançam num bom ritmo, apesar inevitáveis reflexos que a pandemia do Covid-19 impõe para toda a sociedade. Destacamos os seguintes trabalhos realizados:

- Iniciamos as obras do sistema de drenagem com a execução dos caimentos dos campos 1 e 2. Foram abertas as valas de drenagem de forma a garantir as boas condições do gramado, que será plantado posteriormente, mesmo sob intensas chuvas;
- Concluímos o aterro total do terreno com a terraplanagem;
- Muro Frontal e Muro Lateral (lado da comunidade) terminados;
- Fechamos a compra dos módulos habitacionais, o último grande contrato que estava pendente de definição. A instalação no Nosso CT está prevista para o início de julho.

Todo o esforço foi realizado para mantermos o andamento das obras do NOSSO CT e entregá-lo no prazo. O andamento das obras é uma ótima notícia, porém para que os trabalhos continuem é necessário incrementarmos a velocidade das nossas doações.

Contamos com o apoio, sempre incondicional, da torcida vascaína para concluirmos até julho as obras do CT. Para isso, contudo, a captação de recursos não pode parar.

A terceira etapa caminha para sua fase final de captação de recursos via Kickante [www.vasco.com.br/ct](http://www.vasco.com.br/ct), e faltam menos de 500 contas abertas no Meu Vasco BMG [www.meuvascobmg.com.br](http://www.meuvascobmg.com.br) para que mais R\$ 200 mil sejam destinados ao projeto pelo Banco BMG.



Vamos continuar realizando nossas doações #RumoAoNossoCT.

Saudações Vascaínas!

**SIGA EM FRENTE ACOMPANHANDO E CONTRBUINDO!!!**

## 01

**TOTAL  
ARRECADADO  
ATÉ 30/04**

# 107% DA META

1º OBJETIVO / 2 MILHÕES	
DOAÇÃO DIRETA	50.000
DOAÇÃO KICKANTE¹	2.092.899
TOTAL	2.142.899

# 104% DA META

2º OBJETIVO / 1,5 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	1.218.806
DOAÇÃO ADICIONAL INGRESSOS <sup>2</sup>	27.970
DOAÇÃO SOBRE RENDA DO JOGO <sup>3</sup>	6.680
DOAÇÃO BMG <sup>4</sup>	300.000
TOTAL	1.553.456

## 91% DA META

3º OBJETIVO / 1,5 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	586.903
DOAÇÃO BMG <sup>5</sup>	700.000
LOJA DO GIGANTE <sup>6</sup>	10.774
FENG <sup>7</sup>	70.000
TOTAL	1.367.677

<sup>1</sup> Ajuste de R\$ 9.149,62 do total arrecadado no primeiro objetivo, passando de R\$ 2.102.049 para R\$ 2.092.899, em virtude de pagamentos estornados ou não processados.

<sup>2</sup> Doação de R\$ 10,00 feita pelos torcedores ao adquirem ingressos para as partidas contra o Fortaleza, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro.

<sup>3</sup> Doação de R\$ R\$ 5,00 de cada ingresso vendido no jogo VAS x FLA - Sub 20, feita pelo clube.

<sup>4</sup> O BMG contribuiu com R\$ 300 mil para concluir o segundo objetivo da campanha.


<sup>5</sup> O BMG contribuiu com mais R\$ 500 mil para dar o pontapé no terceiro objetivo, além de R\$ 200 mil por cada 10.000 contas abertas.

<sup>6</sup> Doação de 10% sobre as vendas acima de R\$ 300,00 entre os dias 12/12/2019 e 19/12/2019, feita pelas lojas do Gigante.

<sup>7</sup> Parceira do Vasco da Gama na administração do seu programa de Sócio-Torcedor, a FENG doou R\$ 70 mil pela conquista de 100 mil sócios.

TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/04	
1º OBJETIVO	2.142.899
2º OBJETIVO	1.553.456
3º OBJETIVO	1.367.677
TOTAL	5.064.032

## EVOLUÇÃO PERCENTUAL DE DOAÇÕES



02

UTILIZAÇÃO  
DE RECURSOS

SALDO DISPONÍVEL TOTAL	
TOTAL ARRECADADO	5.064.032
RECURSOS UTILIZADOS - 2019	(1.080.965)
RECURSOS UTILIZADOS - JAN.20	(250.746)
RECURSOS UTILIZADOS - FEV.20	(510.423)
RECURSOS UTILIZADOS - MAR.20	(956.901)
RECURSOS UTILIZADOS - ABR.20	(529.831)
SALDO DISPONÍVEL	1.735.166

\* Sobre os valores disponíveis na Kickante incidirá a comissão deste fornecedor, que será, oportunamente, calculada nos termos contratuais.

\*\* Todos os valores entre parênteses são negativos.


03

ORÇADO X REALIZADO  
ATÉ 30/04

%

GRUPO	2019 REALIZADO	1º TRIM.20 REALIZADO	ABR.20 REALIZADO	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL ORÇADO X REALIZADO
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	166.947	127.211	19.159	674.175	313.317	46,5%
SERVIÇOS PRELIMINARES	360.165	84.608	10.496	526.750	455.269	86,4%
DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA	39.998	88.559	31.033	647.580	159.590	24,6%
CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	55.139	5.544	-	88.250	60.682	68,8%
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	30.537	23.393	10.885	156.390	64.815	41,4%
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	70.000	-	0,0%
OPERAÇÃO DE CANTEIRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	10.000	-	0,0%
PREPARO DE TERRENO	167.683	531.722	307.991	986.438	1.007.397	102,1%
CAMPOS DE FUTEBOL	-	540.125	99.350	1.596.144	639.475	40,1%
EDIFICAÇÕES	-	-	-	1.200.000	-	0,0%
CERCAMENTOS MURO E ADORNO	260.495	316.908	50.918	1.328.650	628.321	47,3%
FUNDAÇÕES	-	-	-	145.738	-	0,0%
TOTAL	1.080.965	1.718.070	529.831	7.430.115	3.328.866	44,8%

PERCENTUAL  
DE DOAÇÕES  
POR REGIÃO



CRONOGRAMA DA OBRA														
MESES		ABRIL					MAIO				JUNHO			
ATIVIDADES MACRO		1 a 5	06 a 12	13 a 19	20 a 26	27 a 30	1 a 10	11 a 17	18 a 24	25 a 31	1 a 7	8 a 14	15 a 21	22 a 28
1	ACOMPANHAMENTO DE TOPOGRAFIA													
2	SEGURANÇA PATRIMONIAL													
3	MURO DE DIVISA - FRENTE													
4	MURO DE DIVISA - LATERAL DIREITA													
5	MURO DE DIVISA - LATERAL ESQUERDA													
6	MURO DE DIVISA - FUNDOS													
7	ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÕES DE ENTRADA E PEDESTRES)													
8	PRAÇA DO MASTRO													
9	REDE DE INFRA ESTRUTURA HIDRASANITÁRIAS (DPA E DPE)													
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS													
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS													
12	INSTALAÇÕES GÁS INTERNAS													
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INTERNAS													
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS INTERNAS													
15	INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS INTERNAS													
16	RADIER - MÓDULO DOS ATLETAS													
17	POÇO ARTESIANO E OSMOSE REVERSA													
18	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
19	CAIMENTOS CAMPO 01													
20	CAIMENTOS CAMPO 02													
21	DRENAGEM CAMPO 01													
22	DRENAGEM CAMPO 02													
23	IRRIGAÇÃO CAMPO 01													
24	IRRIGAÇÃO CAMPO 02													


PROXIMAS CONTRATAÇÕES														
MESES		ABRIL					MAIO				JUNHO			
ATIVIDADES MACRO		1 a 5	06 a 12	13 a 19	20 a 26	27 a 30	1 a 10	11 a 17	18 a 24	25 a 31	1 a 7	8 a 14	15 a 21	22 a 28
1	MÓDULO DOS ATLETAS													
2	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
3	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA													
4	AR CONDICIONADO													
5	INSTALAÇÕES EXTERNAS													
6	TELHADO E COBERTURA													
7	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO													
8	POÇO ARTESIANO													

IMAGENS  
DA OBRA

EXECUÇÃO DE CAIMENTOS  
DOS CAMPOS



EXECUÇÃO DE  
DRENAGEM DOS  
CAMPOS

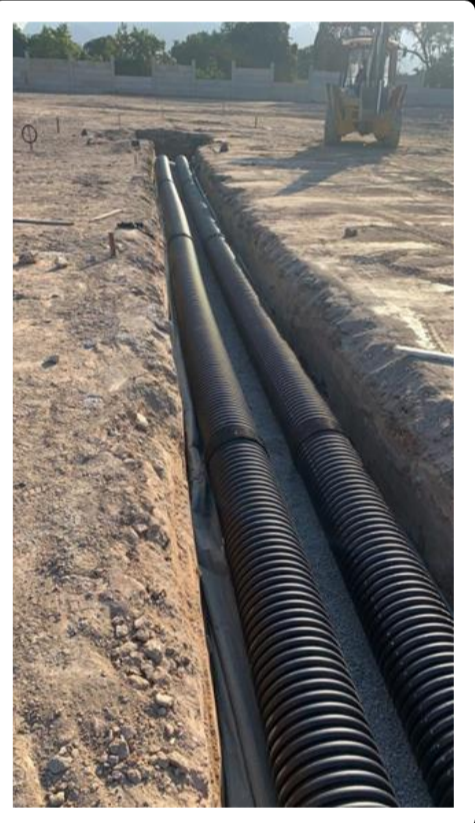

EXECUÇÃO DA CAIXA DE  
DRENAGEM DOS CAMPOS



MURO FRONTAL



MURO FRONTAL E LATERAL



NOSSO CT
