

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio/2020

VASCAÍNOS e VASCAÍNAS,

Encerramos o mês de maio com importantes marcos no andamento do projeto do NossaCT. Certamente o maior destaque neste mês foi a mobilização de nossa torcida para batimento da meta de 20 mil novas contas no Meu Vasco BMG, o rendeu nova doação por parte do Banco.

No tocante às obras do NossaCT, ao longo do mês de maio tivemos o muro lateral finalizado, a instalação do portão de veículos, a conclusão da praça do mastro com pavimentação e pintura do piso, a finalização da vala de drenagem e colchão drenante dos campos 1 e 2, e a instalação de rede de iluminação da rua, fatos estes todos comunicados à torcida por meio de publicação no blog em 15/05.

Na parte da recompensas, informamos que o envio das camisas do Uniforme do CT sofrerá um pequeno atraso, uma vez que a fábrica contratada para confecção dos uniformes está operando com capacidade muito reduzida em virtude da pandemia da COVID-19 e, assim, não conseguirá cumprir o cronograma pré-estabelecido. O novo prazo para entrega das primeiras unidades ao Vasco está previsto para a primeira quinzena de julho.

Os certificados digitais e vouchers descontos dos doadores da terceira etapa estão disponíveis em www.nossoc.com.br/recompensas. As recompensas do Agradecimento no Site e Mapa Interativo também já estão atualizadas com os doadores da terceira etapa.

Por fim, o objetivo 04 já está em andamento e, neste momento, captou diretamente com a torcida em www.vasco.com.br/ct cerca de 8% da meta de R\$ 1 milhão.

Além disso, o clube possui neste momento quase 22 mil novas contas no Meu Vasco BMG www.meuvascobmg.com.br, importante parceiro que segue comprometido em aportar R\$200 mil a cada 10 mil novas contas.

Seguimos juntos, em frente, Rumo Ao Nosso CT!

Saudações Vascaínas!



www.kickante.com.br/vasco

SIGA EM FRENTE ACOMPANHANDO E CONTRIBUINDO!!!

01

TOTAL ARRECADADO ATÉ 31/05

107% DA META

1º OBJETIVO / 2 MILHÕES

DOAÇÃO KICKANTE ¹	2.092.614
DOAÇÃO DIRETA	50.000
TOTAL	2.142.614

103% DA META

2º OBJETIVO / 1,5 MILHÕES

DOAÇÃO KICKANTE ²	1.217.556
DOAÇÃO ADICIONAL INGRESSOS	27.970
DOAÇÃO SOBRE RENDA DO JOGO	6.680
DOAÇÃO BMG	300.000
TOTAL	1.552.206

110% DA META

3º OBJETIVO / 1,5 MILHÕES

DOAÇÃO KICKANTE ³	665.297
DOAÇÃO BMG	900.000
LOJA DO GIGANTE	10.774
DOAÇÃO FENG	70.000
TOTAL	1.646.071

5% DA META

4º OBJETIVO / 1 MILHÃO

DOAÇÃO KICKANTE	54.115
-----------------	--------

Ajuste no total arrecadado através da Kickante, em virtude de pagamentos estornados ou não processados, conforme detalhamento:

¹ OBJETIVO 1: R\$ 285, passando de R\$ 2.092.899 para R\$ 2.092.614;


² OBJETIVO 2: R\$ 1.250, passando de R\$ 1.218.806 para R\$ 1.217.556;

³ OBJETIVO 3: R\$ 501, passando de R\$ 665.798 para R\$ 665.297.


TOTAL ARRECADADO ATÉ 31/05

1º OBJETIVO	2.142.614
2º OBJETIVO	1.552.206
3º OBJETIVO	1.646.071
4º OBJETIVO	54.115
TOTAL	5.395.006

EVOLUÇÃO
PERCENTUAL
DE DOAÇÕES



PERCENTUAL
DE DOAÇÕES
POR REGIÃO



02

PARCERIAS COMERCIAIS

BANCO BMG

O Vasco e o Banco BMG firmaram uma importante parceria para construção do CT: a cada 10 mil novas contas gratuitas no site www.meuvascobmg.com.br, o Banco BMG doará R\$ 200 mil. A meta é abrir 50 mil novas contas até atingir o montante de R\$ 1 milhão.

MEU BILHETE

A Meu Bilhete, empresa responsável pela emissão de ingressos para todos os jogos do Vasco da Gama, doou R\$ 50 mil através da plataforma Kickante.

FENG

Parceira do Vasco da Gama na administração do seu programa de Sócio-Torcedor, a FENG doou R\$ 70 mil pela conquista de 100 mil sócios.

LOJA GIGANTE DA COLINA

Todas as lojas Gigante da Colina doaram 10% sobre as vendas acima de R\$ 300,00 entre os dias 12/12/2019 e 19/12/2019.

03

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

SALDO DISPONÍVEL TOTAL	
TOTAL ARRECADADO	5.395.006
RECURSOS UTILIZADOS - 2019	(1.080.965)
RECURSOS UTILIZADOS - JAN.20	(250.746)
RECURSOS UTILIZADOS - FEV.20	(510.423)
RECURSOS UTILIZADOS - MAR.20	(956.901)
RECURSOS UTILIZADOS - ABR.20	(529.831)
RECURSOS UTILIZADOS - MAI.20	(381.664)
SALDO DISPONÍVEL	1.684.476

* Sobre os valores disponíveis na Kickante incidirá a comissão deste fornecedor, que será, oportunamente, calculada nos termos contratuais.

** Todos os valores entre parênteses são negativos.

04 ORÇADO X REALIZADO ATÉ 31/05

%

GRUPO	2019 REALIZADO	1º TRIM.20 REALIZADO	ABR.20 REALIZADO	MAI.20 REALIZADO	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL ORÇADO X REALIZADO
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	166.947	127.211	19.159	12.094	674.175	325.411	48,3%
SERVIÇOS PRELIMINARES	360.165	84.608	10.496	33.603	526.750	488.873	92,8%
DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA	39.998	88.559	31.033	37.330	647.580	196.920	30,4%
CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	55.139	5.544	-	2.000	88.250	62.682	71,0%
IMPLEMENTAÇÃO DE CANTEIRO	30.537	23.393	10.885	24.592	156.390	89.406	57,2%
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	70.000	-	0,0%
OPERAÇÃO DE CANTEIRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	10.000	-	0,0%
PREPARO DE TERRENO	167.683	531.722	307.991	170.744	986.438	1.178.141	119,4%
CAMPOS DE FUTEBOL	-	540.125	99.350	74.785	1.596.144	714.260	44,7%
EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	1.200.000	-	0,0%
CERCAMENTOS MURO E ADORNO	260.495	316.908	50.918	26.516	1.328.650	654.837	49,3%
FUNDAÇÕES	-	-	-	-	145.738	-	0,0%
TOTAL	1.080.965	1.718.070	529.831	381.664	7.430.115	3.710.530	49,9%

05 RELATÓRIO TÉCNICO DO PERÍODO

CRONOGRAMA DA OBRA

PROXIMAS CONTRATAÇÕES

IMAGENS
DA OBRA

PRAÇA DO MASTRO




VALA DE DREANAGEM
CAMPO 2



PILARES DO MURO DA
LATERAL DIREITA



CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO
MURO DA LATERAL DIREITA

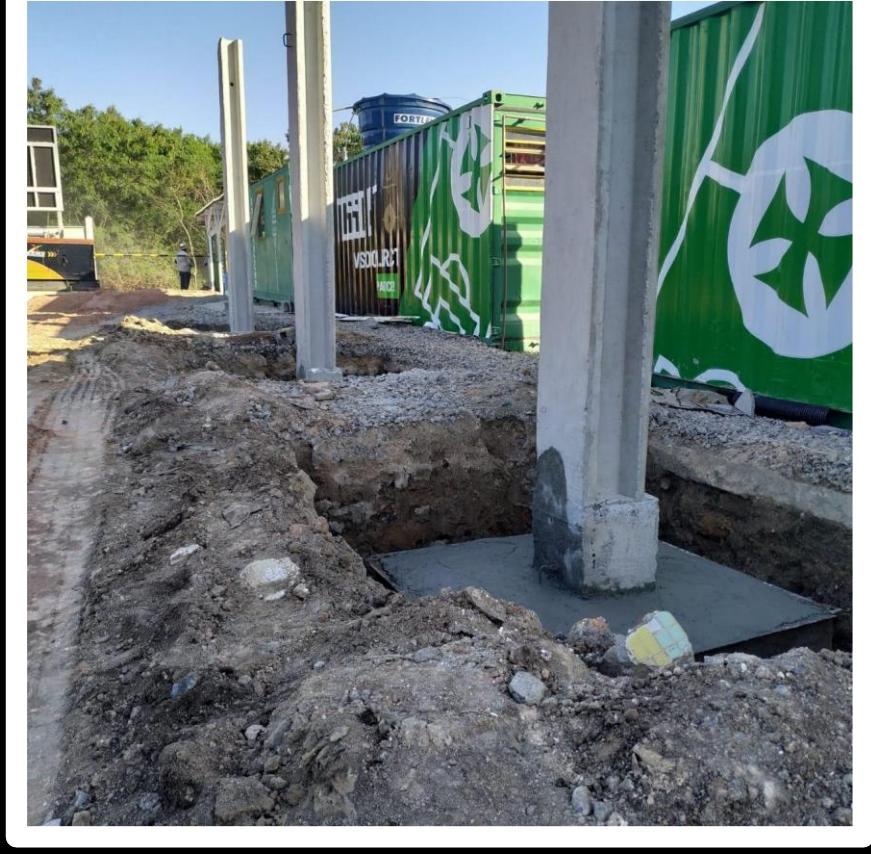

ILUMINAÇÃO
EXTERNA DA RUA



NOS550 CT
