

NOSSECT



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho/2020

VASCAÍNOS e VASCAÍNAS,

Passado o primeiro semestre deste desafiador 2020, o projeto do NossoCT segue avançando e apresentando novidades importantes.

Nas obras, tivemos a finalização da drenagem em areia no campo 1, a execução da fundação em radier das edificações, a automação do mastro e a construção da portaria da rua principal, para garantir maior segurança. Além disso, iniciamos também a irrigação do campo 1.

No tocante as recompensas, o Clube disponibilizou certificados, mapa interativo e vouchers da 3ª etapa no mês de junho, os quais podem ser acessados www.nossoct.com.br/recompensas.

O Uniforme do NossoCT, que foi utilizado na vitória diante do Madureira no começo de julho, também está sendo ofertado para os torcedores que adquirirem o jogo-treino de estreia do NossoCT, cujos ingressos são comercializados em

<https://www.ingressocerto.com/treine-no-ct-jogo-treinocomum>.

Seguimos firmes com as obras. O Clube vem direcionando verbas do seu caixa para que a construção não pare, por isso é muito importante e necessário que a torcida Vascaína continue realizando doações para atingirmos o 4º Objetivo.

Saudações Vascaínas!



www.kickante.com.br/vasco

SIGA EM FRENTE ACOMPANHANDO E CONTRBUINDO!!!

01 TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06

107% DA META

1° OBJETIVO / 2 MILHÕES

DOAÇÃO KICKANTE	2.092.614
DOAÇÃO DIRETA	50.000
TOTAL	2.142.614

103% DA META

2° OBJETIVO / 1,5 MILHÕES

DOAÇÃO KICKANTE	1.217.556
DOAÇÃO ADICIONAL INGRESSOS	27.970
DOAÇÃO SOBRE RENDA DO JOGO	6.680
DOAÇÃO BMG	300.000
TOTAL	1.552.206

110% DA META

3° OBJETIVO / 1,5 MILHÕES

DOAÇÃO KICKANTE	665.297
DOAÇÃO BMG	900.000
LOJA DO GIGANTE	10.774
DOAÇÃO FENG	70.000
TOTAL	1.646.071

14% DA META

4° OBJETIVO / 1 MILHÃO

DOAÇÃO KICKANTE	139.959
-----------------	---------

OUTROS


RECURSOS PRÓPRIOS CRVG	320.000
------------------------	---------

TOTAL ARRECADADO ATÉ 30/06


1° OBJETIVO	2.142.614
2° OBJETIVO	1.552.206
3° OBJETIVO	1.646.071
4° OBJETIVO	139.959
RECURSOS PRÓPRIOS CRVG	320.000
TOTAL	5.800.850

EVOLUÇÃO

PERCENTUAL DE DOAÇÕES



PERCENTUAL DE DOAÇÕES POR REGIÃO



02

PARCERIAS COMERCIAIS

BANCO BMG

O Vasco e o Banco BMG firmaram uma importante parceria para construção do CT: a cada 10 mil novas contas gratuitas no site www.meuvascobmg.com.br, o Banco BMG doará R\$ 200 mil. A meta é abrir 50 mil novas contas até atingir o montante de R\$ 1 milhão.

MEU BILHETE

A Meu Bilhete, empresa responsável pela emissão de ingressos para todos os jogos do Vasco da Gama, doou R\$ 50 mil através da plataforma Kickante.

FENG

Parceira do Vasco da Gama na administração do seu programa de Sócio-Torcedor, a FENG doou R\$ 70 mil pela conquista de 100 mil sócios.

LOJA GIGANTE DA COLINA

Todas as lojas Gigante da Colina doaram 10% sobre as vendas acima de R\$ 300,00 entre os dias 12/12/2019 e 19/12/2019.

03

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

SALDO DISPONÍVEL TOTAL	
TOTAL ARRECADADO	5.800.850
RECURSOS UTILIZADOS - 2019	(1.080.965)
RECURSOS UTILIZADOS - JAN.20	(250.746)
RECURSOS UTILIZADOS - FEV.20	(510.423)
RECURSOS UTILIZADOS - MAR.20	(956.901)
RECURSOS UTILIZADOS - ABR.20	(529.831)
RECURSOS UTILIZADOS - MAI.20	(381.664)
RECURSOS UTILIZADOS - JUN.20	(1.481.087)
SALDO DISPONÍVEL	609.233

* Sobre os valores disponíveis na Kickante incidirá a comissão deste fornecedor, que será, oportunamente, calculada nos termos contratuais.

** Todos os valores entre parênteses são negativos.

04 ORÇADO X REALIZADO ATÉ 30/06

GRUPO	2019 REALIZADO	1º TRIM.20 REALIZADO	ABR.20 REALIZADO	MAI.20 REALIZADO	JUN.20 REALIZADO	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL % REALIZADO
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	166.947	127.211	19.159	12.094	27.382	674.175	352.793	52,3%
SERVIÇOS PRELIMINARES	360.165	84.608	10.496	33.603	10.069	526.750	498.942	94,7%
DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA	39.998	88.559	31.033	37.330	59.863	647.580	256.783	39,7%
CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	55.139	5.544	-	2.000	2.000	88.250	64.682	73,3%
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	30.537	23.393	10.885	24.592	6.332	156.390	95.738	61,2%
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	70.000	-	0,0%
OPERAÇÃO DE CANTEIRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	10.000	-	0,0%
PREPARO DE TERRENO	167.683	531.722	307.991	170.744	25.257	986.438	1.203.398	122,0%
CAMPOS DE FUTEBOL	-	540.125	99.350	74.785	484.186	1.596.144	1.198.446	75,1%
EDIFICAÇÕES	-	-	-	-	682.948	1.200.000	682.948	56,9%
CERCAMENTOS MURO E ADORNO	260.495	316.908	50.918	26.516	33.130	1.328.650	687.967	51,8%
FUNDAÇÕES	-	-	-	-	149.920	145.738	149.920	102,9%
TOTAL	1.080.965	1.718.070	529.831	381.664	1.481.087	7.430.115	5.191.617	69,9%

05 RELATÓRIO TÉCNICO DO PERÍODO

CRONOGRAMA DA OBRA

MESES	ATIVIDADES MACRO	JUNHO				JULHO					AGOSTO				SETEMBRO			
		01 a 06	07 a 13	14 a 20	21 a 27	28 a 04	05 a 11	12 a 18	19 a 25	26 a 31	3 a 9	10 a 16	17 a 23	24 a 30	1 a 6	7 a 13	14 a 20	21 a 27
1	ACOMPANHAMENTO DE TOPOGRAFIA																	
2	SEGURANÇA PATRIMONIAL																	
3	MURO DE DIVISA - FRENTE																	
4	MURO DE DIVISA - LATERAL DIREITA																	
5	MURO DE DIVISA - LATERAL ESQUERDA																	
6	MURO DE DIVISA - FUNDOS																	
7	ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÕES DE ENTRADA E PEDESTRES)																	
8	PRAÇA DO MASTRO																	
9	REDE DE INFRA ESTRUTURA HIDRASANITÁRIAS (DPA E DPE)																	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS																	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS																	
12	INSTALAÇÕES GÁS INTERNAS																	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INTERNAS																	
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS INTERNAS																	
15	INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS INTERNAS																	
16	RADIER - MÓDULO DOS ATLETAS																	
17	POÇO ARTESIANO e INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS																	
18	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO																	
19	CAIMENTOS CAMPO 01																	
20	CAIMENTOS CAMPO 02																	
21	DRENAGEM CAMPO 01																	
22	DRENAGEM CAMPO 02																	
23	IRRIGAÇÃO CAMPO 01																	
24	IRRIGAÇÃO CAMPO 02																	
25	GRAMA CAMPO 01																	
26	GRAMA CAMPO 02																	
27	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO																	


IMAGENS DA OBRA



RADIER DE MÓDULO DOS ATLETAS



RADIER DE MÓDULO DE SERVIÇOS

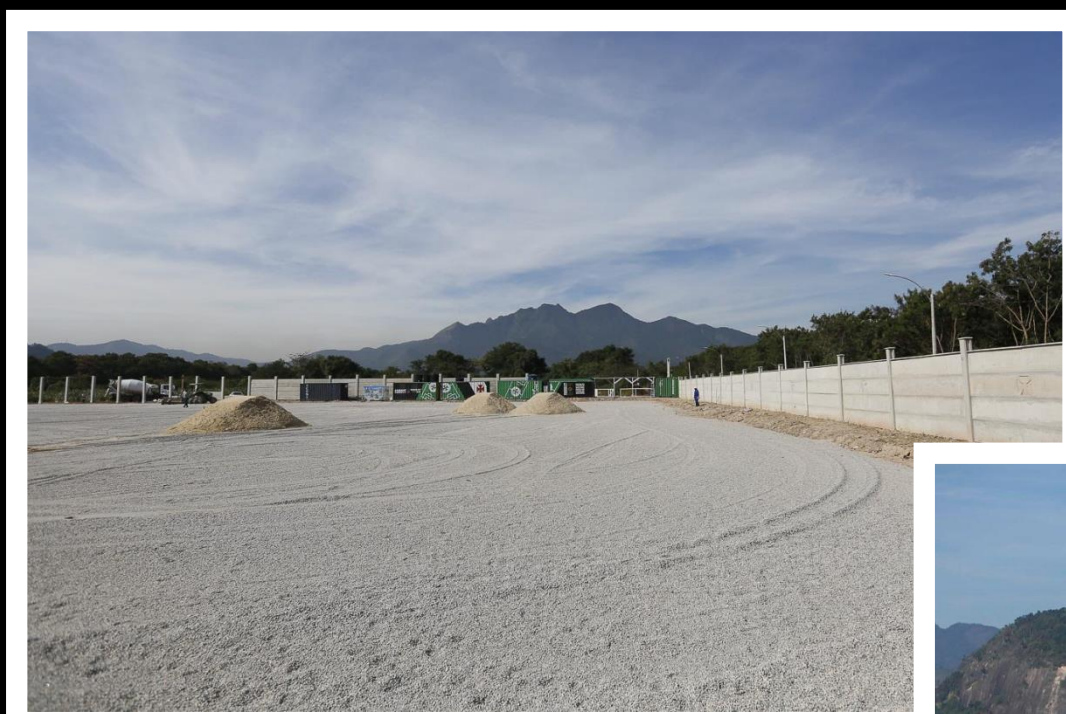

DRENAGEM COM BRITA

**NIVELAMENTO A LASER
DA BRITA**



**RECEBIMENTO DE AREIA PARA
SEGUNDA FASE DA DRENAGEM**

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA



PORTÃO DE VEÍCULOS



NOSSO ET
