

NOSSE CT



VASCO.COM.BR/CT

PARTICIPE!

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto/2020

VASCAÍNOS e VASCAÍNAS,

Impossível iniciar esta prestação de contas sem agradecer pelo maravilhoso empenho disposto por cada um de vocês, que realizaram quase 40 mil doações ao longo de 4 etapas, totalizando mais de R\$5,8 milhões captados entre Kickante, BMG e demais parceiros.

Como destacado nas cerimônias de inauguração do CT do Almirante e no Jogo-Treino Jogue no CT, a torcida vascaína é a maior patrocinadora deste Clube, e assim orgulhosamente sempre será.

Dado este curto mas necessário relato e agradecimento, a presente prestação atual refere-se ao mês de agosto de 2020. Neste mês o clube realizou, pela primeira vez, o hasteamento do pavilhão no CT do Almirante, em um evento emocionante que contou com a transmissão da VascoTV.

No campo da engenharia, os módulos que receberão os atletas foram concluídos no mês de agosto, e você pode conferir todos os vídeos em <https://nossoct.com.br/andamento-das-obras/>

Além disso, os doadores que selecionaram o pacote de recompensas “Uniforme do CT” na terceira etapa já receberam suas camisas, com alguns poucos casos em trânsito em virtude de atrasos nos Correios.

Conforme definido em FAQ, o prazo de entrega de todas as recompensas é de 60 dias após o encerramento da etapa de captação. Portanto, caso você doou na quarta etapa, suas recompensas ainda não foram enviadas.

Por fim, convocamos nossa torcida para nessa reta final de setembro completarmos o 4º objetivo, o qual necessita de pouco mais de R\$450 mil, valor muito necessário para que possamos finalizar todos últimos detalhes que faltam na construção do CT do Almirante e permitir que nosso elenco profissional inicie seus treinamentos no local o quanto antes.

Torcedor vascaíno: contribua agora em www.vasco.com.br/ct, e divulgue para seus amigos esta [#retafinalrumoaonossoct](https://twitter.com/retafinalrumoaonossoct).

Saudações Vascaínas!



SIGA EM FRENTE ACOMPANHANDO E CONTRBUINDO!!!

01

TOTAL
ARRECADADO
ATÉ 31/08

107% DA META

1º OBJETIVO / 2 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	2.092.614
DOAÇÃO DIRETA	50.000
TOTAL	2.142.614

103% DA META

2º OBJETIVO / 1,5 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	1.217.556
DOAÇÃO ADICIONAL INGRESSOS	27.970
DOAÇÃO SOBRE RENDA DO JOGO	6.680
DOAÇÃO BMG	300.000
TOTAL	1.552.206

110% DA META

3º OBJETIVO / 1,5 MILHÕES	
DOAÇÃO KICKANTE	665.297
DOAÇÃO BMG	900.000
LOJA DO GIGANTE	10.774
DOAÇÃO FENG	70.000
TOTAL	1.646.071


48% DA META

4º OBJETIVO / 1 MILHÃO	
DOAÇÃO KICKANTE	478.358
LEILÃO CAMISA OFICIAL DO CT	1.200
TOTAL	479.558


OUTROS	
RECURSOS PRÓPRIOS CRVG	2.174.404

TOTAL ARRECADADO ATÉ 31/08	
1º OBJETIVO	2.142.614
2º OBJETIVO	1.552.206
3º OBJETIVO	1.646.071
4º OBJETIVO	478.358
RECURSOS PRÓPRIOS CRVG	2.174.404
TOTAL	7.993.654

EVOLUÇÃO
PERCENTUAL
DE DOAÇÕES

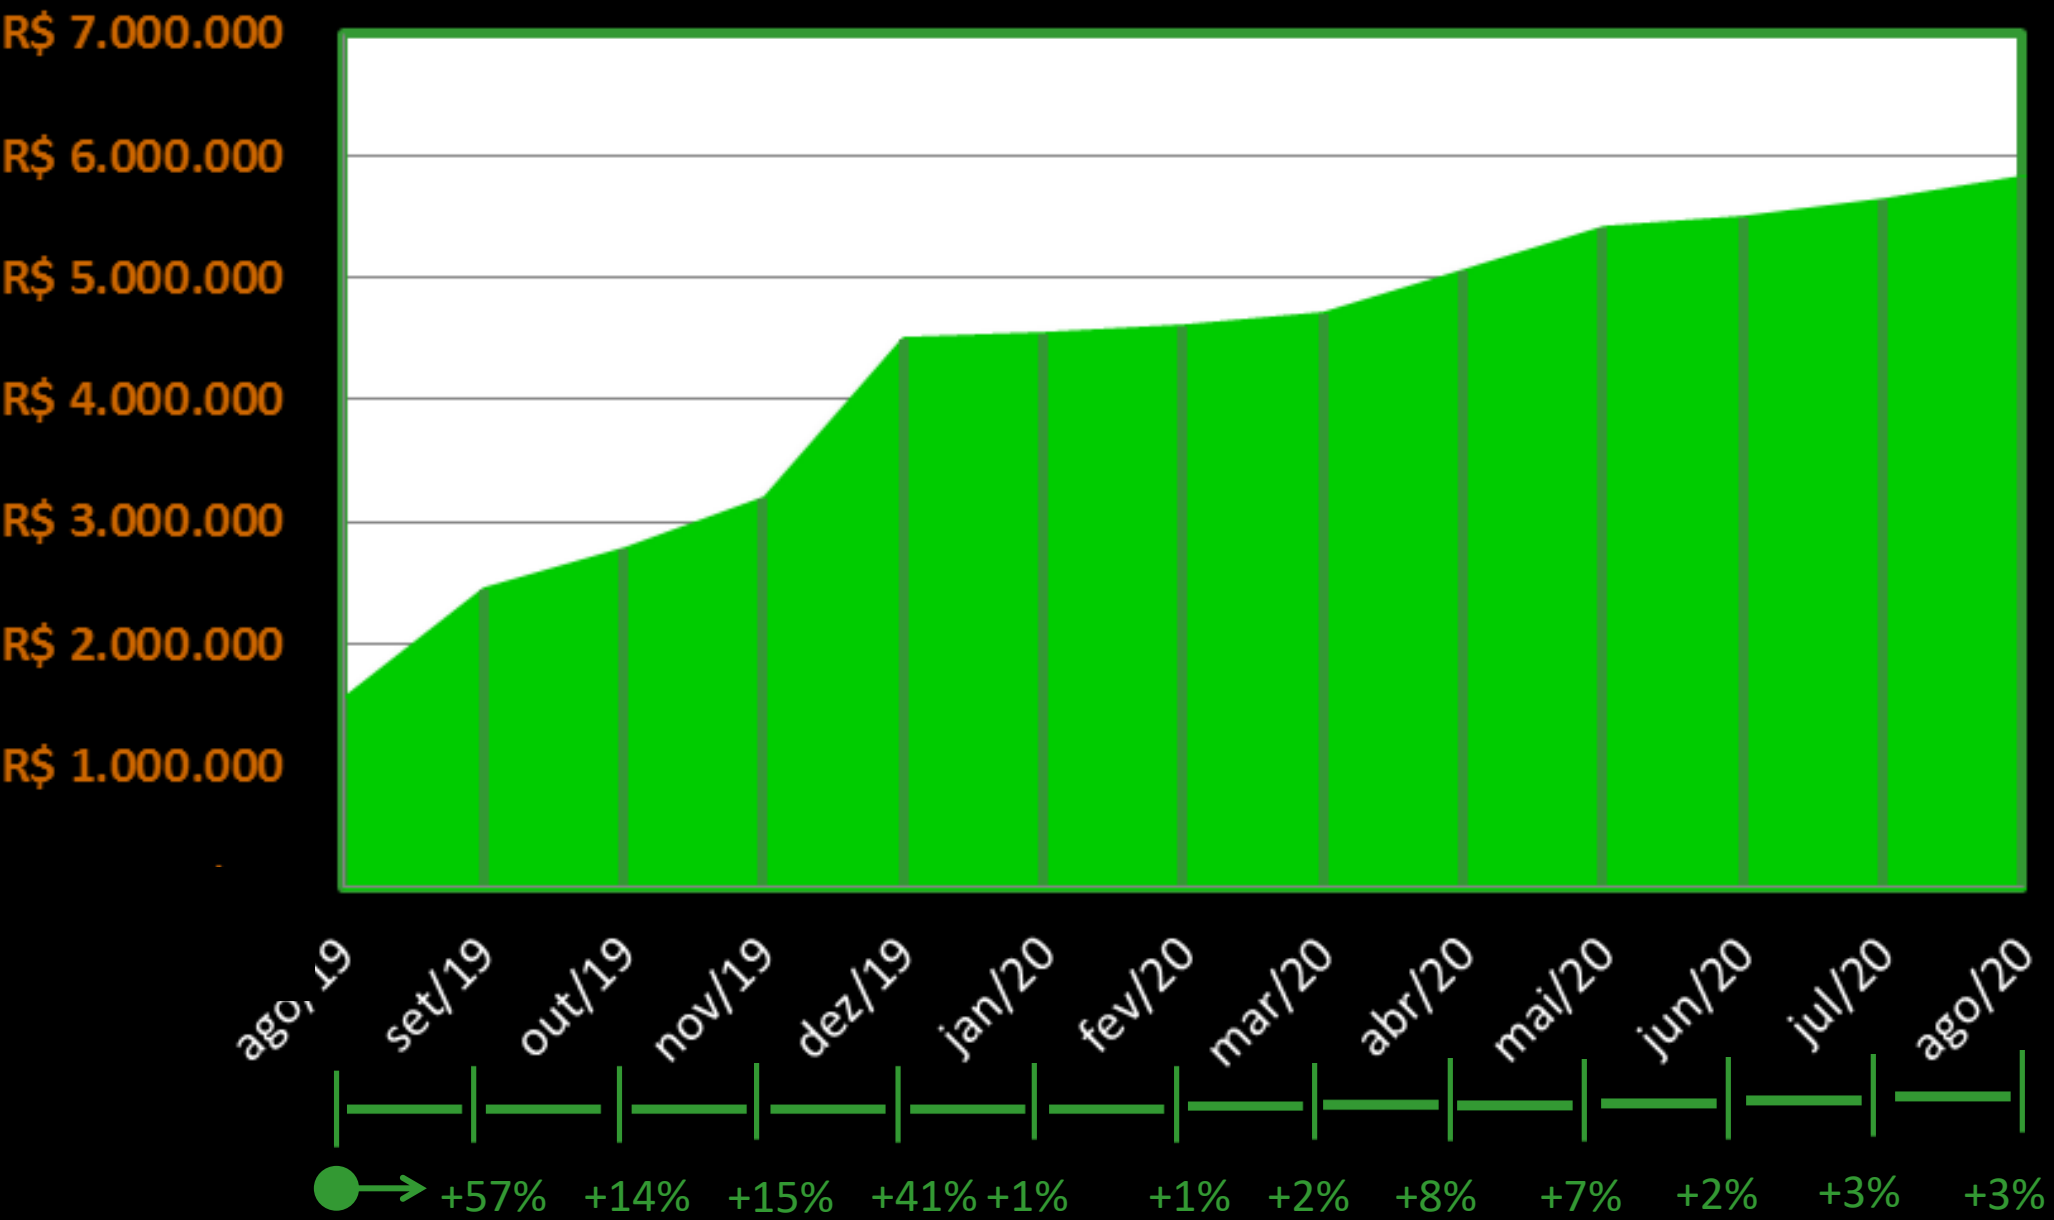

PERCENTUAL
DE DOAÇÕES
POR REGIÃO



02

PARCERIAS
COMERCIAIS

BANCO BMG

O Vasco e o Banco BMG firmaram uma importante parceria para construção do CT: a cada 10 mil novas contas gratuitas no site www.meuvascobmg.com.br, o Banco BMG doará R\$ 200 mil. A meta é abrir 50 mil novas contas até atingir o montante de R\$ 1 milhão.

MEU BILHETE

A Meu Bilhete, empresa responsável pela emissão de ingressos para todos os jogos do Vasco da Gama, doou R\$ 50 mil através da plataforma Kickante.

FENG

Parceira do Vasco da Gama na administração do seu programa de Sócio-Torcedor, a FENG doou R\$ 70 mil pela conquista de 100 mil sócios.

LOJA GIGANTE DA COLINA

Todas as lojas Gigante da Colina doaram 10% sobre as vendas acima de R\$ 300,00 entre os dias 12/12/2019 e 19/12/2019.



03

UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS

SALDO DISPONÍVEL TOTAL	
TOTAL ARRECADADO	7.993.654
RECURSOS UTILIZADOS - 2019	(1.080.965)
RECURSOS UTILIZADOS - JAN.20	(250.746)
RECURSOS UTILIZADOS - FEV.20	(510.423)
RECURSOS UTILIZADOS - MAR.20	(956.901)
RECURSOS UTILIZADOS - ABR.20	(529.831)
RECURSOS UTILIZADOS - MAI.20	(381.664)
RECURSOS UTILIZADOS - JUN.20	(1.481.087)
RECURSOS UTILIZADOS - JUL.20	(1.246.071)
RECURSOS UTILIZADOS - AGO.20	(904.942)
SALDO DISPONÍVEL	651.024

* Sobre os valores disponíveis na Kickante incidirá a comissão deste fornecedor, que será, oportunamente, calculada nos termos contratuais.
** Todos os valores entre parênteses são negativos.

04

ORÇADO X REALIZADO
ATÉ 31/08

%

GRUPO	2019 REALIZADO	1º TRIM.20 REALIZADO	2º TRIM.20 REALIZADO	JUL.20 REALIZADO	AGO.20 REALIZADO	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL ORÇADO X REALIZADO
DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO	166.947	127.211	58.635	60.028	105.642	674.175,00	412.821	61,2%
SERVIÇOS PRELIMINARES	360.165	84.608	54.168	14.078	18.485	526.750,00	513.019	97,4%
DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA	39.998	88.559	128.225	107.540	71.247	647.580,06	364.322	56,3%
CUSTO ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS LEVES	55.139	5.544	4.000	2.000	5.403	88.250,00	66.682	75,6%
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	30.537	23.393	41.808	11.312	46.710	156.390,00	107.050	68,5%
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	-	-	-	-		70.000,00	-	0,0%
OPERAÇÃO DE CANTEIRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		10.000,00	-	0,0%
PREPARO DE TERRENO	167.683	531.722	503.992	-		986.437,50	1.203.398	122,0%
CAMPOS DE FUTEBOL	-	540.125	658.321	416.195	74.950	1.596.144,00	1.614.641	101,2%
EDIFICAÇÕES	-	-	682.948	570.917	522.526	1.200.000,00	1.253.865	104,5%
CERCAMENTOS MURO E ADORNO	260.495	316.908	110.564	42.001	42.006	1.328.650,00	729.968	54,9%
FUNDAÇÕES	-		149.920	22.000	17.972	145.738,35	171.920	118,0%
TOTAL	1.080.965	1.718.070	2.392.582	1.246.071	904.942	7.430.115	6.437.688	86,6%

05

RELATÓRIO
TÉCNICO
DO PERÍODO


CRONOGRAMA DA OBRA														
MESES		JULHO					AGOSTO				SETEMBRO			
ATIVIDADES MACRO		28 a 04	05 a 11	12 a 18	19 a 25	26 a 31	3 a 9	10 a 16	17 a 23	24 a 30	1 a 6	7 a 13	14 a 20	21 a 27
1	ACOMPANHAMENTO DE TOPOGRAFIA													
2	SEGURANÇA PATRIMONIAL													
3	MURO DE DIVISA - FRENTE													
4	MURO DE DIVISA - LATERAL DIREITA													
5	MURO DE DIVISA - LATERAL ESQUERDA													
6	MURO DE DIVISA - FUNDOS													
7	ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÕES DE ENTRADA E PEDESTRES)													
8	PRAÇA DO MASTRO													
9	REDE DE INFRA ESTRUTURA HIDRASANITÁRIAS (DPA E DPE)													
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS													
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS													
12	INSTALAÇÕES GÁS INTERNAS													
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INTERNAS													
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS INTERNAS													
15	INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS INTERNAS													
16	RADIER - MÓDULO DOS ATLETAS													
17	POÇO ARTESIANO e INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS													
18	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
19	CAIMENTOS CAMPO 01													
20	CAIMENTOS CAMPO 02													
21	DRENAGEM CAMPO 01													
22	DRENAGEM CAMPO 02													
23	IRRIGAÇÃO CAMPO 01													
24	IRRIGAÇÃO CAMPO 02													
25	GRAMA CAMPO 01													
26	GRAMA CAMPO 02													
27	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO													



IMAGENS
DA OBRA



SALA DE IMPRENSA

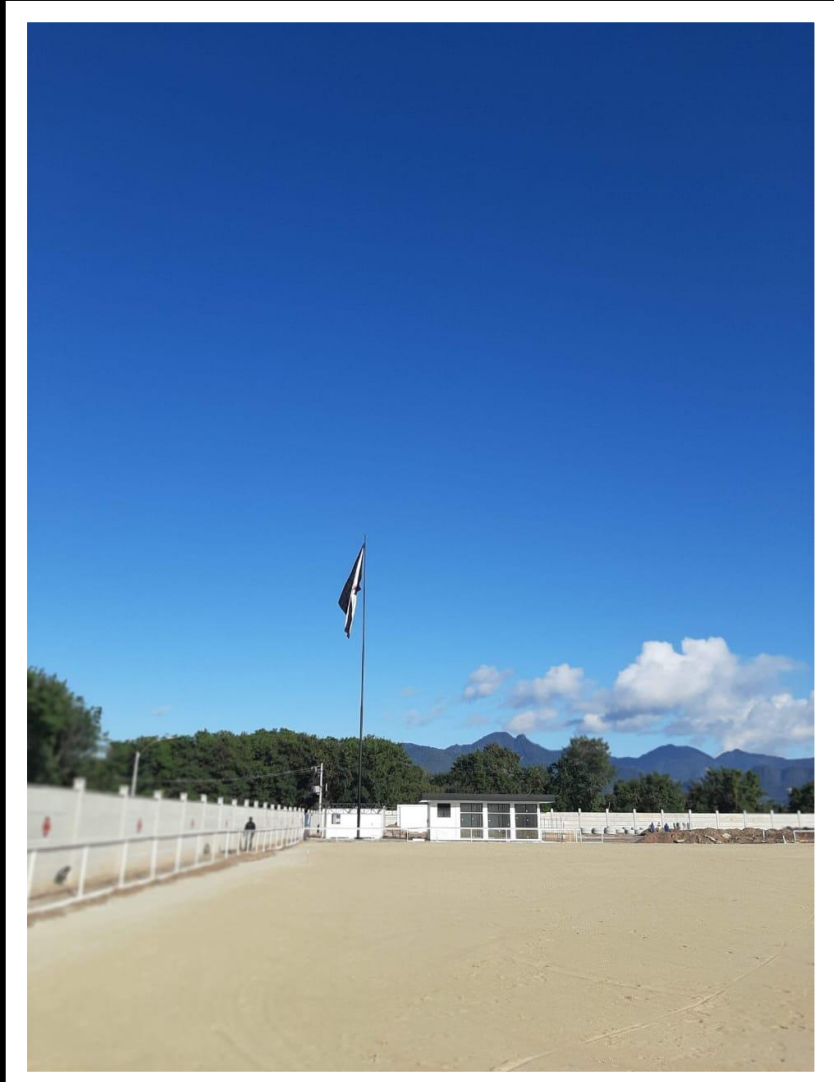

CAMPO 1 - NIVELADO



HASTEAMENTO DA BANDEIRA



MÓDULO DOS ATLETAS
MONTAGEM



MÓDULO DOS ATLETAS
INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO



NOSSO CT
